



**“LIFE Pieniny PL”**



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

Krościenko n/D 30.06.2014 r.

LF -081-1.1.2/2014

## **Raport kwartalny z realizacji projektu „LIFE Pieniny PL” w okresie 01.03.2014 – 30.06.2014 roku**

Celem raportu jest przedstawienie bieżącego zaawansowania projektu LIFE+ p.t. „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny” realizowanego w Pienińskim Parku Narodowym.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy LIFE12 NAT/PL/000034 zawartej w dniu 30 sierpnia 2013 roku pomiędzy Unią Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską a Pienińskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krościenku n.D, ul Jagiellońska 107b, 34-450, z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji, na podstawie umowy nr 572/2013/Wn-06/OP-WK-LF/D zawartej w dniu 22 sierpnia 2013 roku pomiędzy NFOŚiGW a Pienińskim PN.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem.


1. Do końca II kwartału 2014 roku całkowicie zakończony został kamień milowy (A.2 *zakup sprzętu*). Dostarczono samochód (24.03.2014), sprzęt fotograficzny (19.03.2014) oraz odbiorniki GPS (24.03.2014).
2. W dniu 29 kwietnia 2014 roku podpisano umowę nr LF-081-1.3.8/2014 z firmą RS Volley s.c. wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego 18 kwietnia 2014 roku na wykonanie gadżetów promujących projekt (koszulki - 1000 szt., kubki - 1000 szt. torby - 1000 szt.). Zamówienie zostało zrealizowane w dniu 13 czerwca 2014 roku.
3. W dniu 12 czerwca 2014 roku do siedziby PPN dostarczono foldery informacyjne o projekcie w wersji polskiej (2000 szt.), słowackiej (1000 szt.), oraz angielskiej (1000 szt.). Zamówienie zostało wykonane zgodnie z umową nr LF-081-1.3.11E/14 zawartą w dniu 15 maja 2014 roku z Drukarnią Kolejową Kraków Sp.z o.o. wyłonioną w drodze zapytania ofertowego. Wersja słowacka została przetłumaczona przez firmę „languagehouse” z siedzibą w Nowy Targu. Wersja angielska przetłumaczona została przez pracowników PPN Ewelinę Zajęc i Andrzeja Kowalskiego.
4. Na podstawie zlecenia nr LF -81-1.3.9/14 z dnia 12 maja 2014 roku Pracownia Reklamowa „Symptom 2” s.c. wykonała oraz dostarczyła 6 tablic informacyjnych o projekcie, które zostały zamontowane w pawilonach wystawowych Pienińskiego Parku Narodowego. Ich lokalizację przedstawiono na poniższej mapce.



## "LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

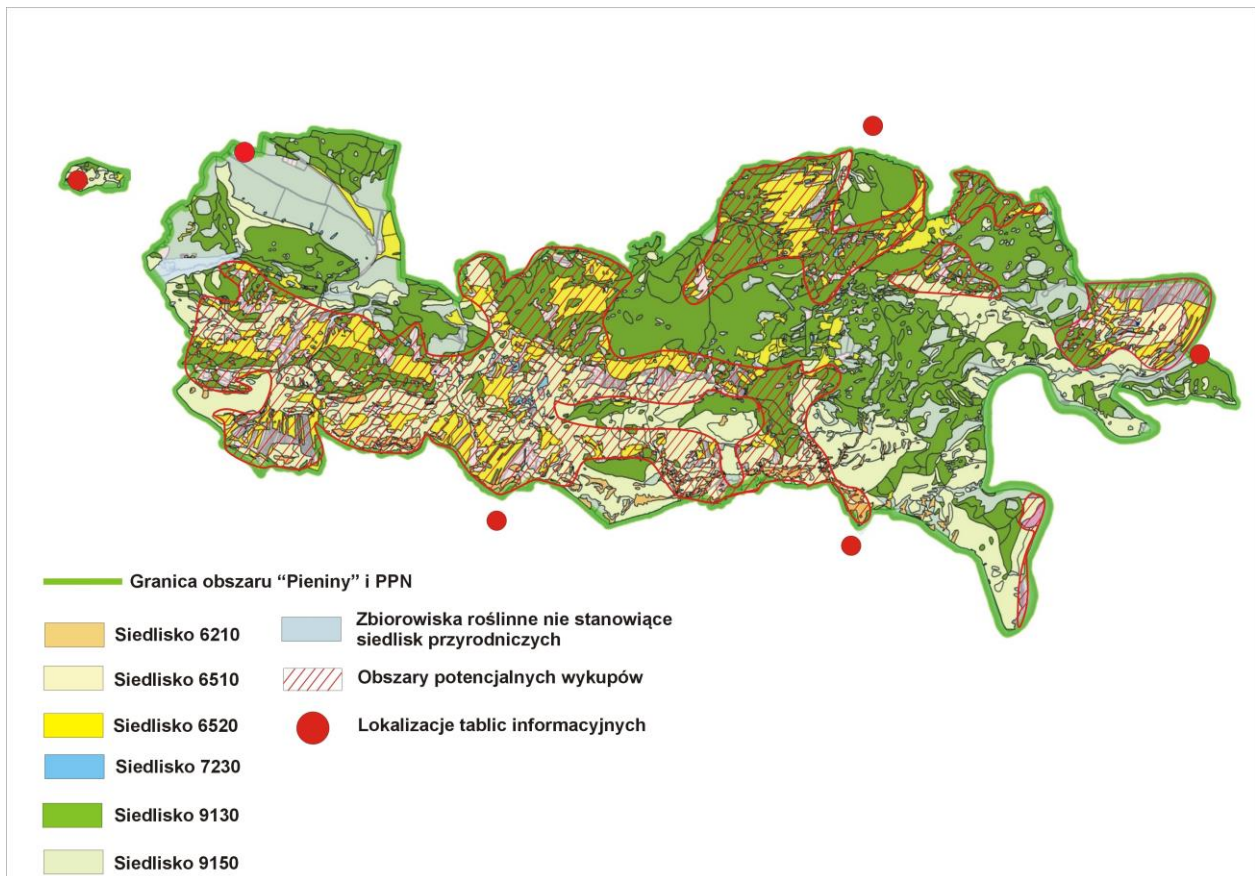

Mapka przedstawiająca lokalizację tablic informacyjnych o projekcie

5. W dniu 17.03.2014 roku do Komisji Europejskiej przesłany został raport wstępny (Inception report). Raport został pozytywnie przyjęty i zaakceptowany przez Komisję Europejską potwierdzającą to listem nadesłanym do PPN w dniu 28 kwietnia 2014 roku.
6. W ramach działania C.4 Ochrona pszonaka pienińskiego (\*2114) w dniu 04.04.2014 roku zawarta została umowa z architektem Piotrem Stępnem na pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego-konserwatorskiego nad robotami związanymi z zabezpieczeniem przed osypywaniem się fragmentu murów zewnętrznych zamku Czorsztyn. W dniu 16 czerwca 2014 roku ogłoszony został przetarg ograniczony w celu wyboru wykonawców na przeprowadzenie remontu murów zamku. W drugim etapie przetargu do złożenia oferty dopuszczona została jedna z pięciu firm, które złożyły wnioski. Firma ta jako jedyna spełniła wymagania formalne. Termin składania ofert został ustalony na 17 lipca 2014 roku.
7. W dniu 14.04.2014 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Przeprowadzenie monitoringu skuteczności działań ochronnych realizowanych w ramach projektu „LIFE Pieniny PL”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 30.04.2014 roku, podpisano 8 umów na wykonanie poszczególnych części zamówienia z następującymi firmami:
  - 1) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach – 3 umowy podpisane 12.05.2014 roku



## "LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

- LF-081-1.3.10A/2014 – Monitoring skuteczności zabiegów na wykupionych łąkach i procesów przyrodniczych w wykupionych ekosystemach leśnych
  - LF-081-1.3.10C/2014 – Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – regeneracja roślinności
  - LF-081-1.3.10D/2014 – Monitoring skuteczności zabiegów na murawach
- 2) IGIPZ PAN Stacja Naukowa z siedzibą w Warszawie – umowa z dnia 09.05.2014 nr LF-081-1.3.10B/2014 – Monitoring efektów związanych z remontem szlaków – erozja gleby.
  - 3) ProGea Consulting Piotr Wężyk z siedzibą w Krakowie - umowa z dnia 12.05.2014 nr LF-081-1.3.10E/2014 – Monitoring efektów zabiegów ochronnych w siedlisku pszonaka pienińskiego.
  - 4) „Dendrologicznie Maciej Byrczek” - umowa z dnia 12.05.2014 nr LF-081-1.3.10F/2014 – Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych.
  - 5) Usługi Ekologiczne Alojzy Przemyski z siedzibą w Sędziszowie - umowa z dnia 12.05.2014 nr LF-081-1.3.10G/2014 – Monitoring płazów.

Do końca II kwartału 2014 roku wszystkie z wyżej wymienionych firm rozpoczęły prace terenowe, które zgodnie z zawartymi umowami zostaną zakończone najpóźniej do 31 sierpnia. Monitoring skuteczności usuwania gatunków inwazyjnych połączony został z ich usuwaniem. Sposób monitorowania i zabiegi usuwania oceniały w terenie dwie pracownice PPN: Małgorzata Braun i Agnieszka Trzaska.

8. Zgodnie z umową nr LF-081-1.3.3/14 na wykonanie badania ewaluacyjnego pt: Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań w ramach projektu „LIFE Pieniny PL” w dniu 17 marca 2014 roku dostarczone raport metodologiczny, natomiast 19 maja 2014 roku raport otwarcia „Diagnoza stanu”.
9. W ramach działania B.1 (*Zakup gruntów*) w II kwartale 2014 roku zakupiono 2,2342 ha za łączną kwotę 141 551,78 zł (w tym środki z NFOŚiGW - 60 823,29 zł, środki z Komisji Europejskiej - 80 728,49 zł). Podpisano 6 umów kupna w formie aktu notarialnego. Łącznie kupiono 23 działki. W II kwartale 2014 roku wykorzystano w całości wszystkie dostępne w 2014 roku środki z NFOŚiGW przeznaczone na zakup gruntów. W związku z powyższym 26 czerwca 2014 roku wysłano do NFOŚiGW pismo z prośbą o przesunięcie środków w wysokości 286 964,00 zł przewidzianych w II kwartale 2015 roku na 2014 rok (III kwartał - 160 000,00 zł; IV kwartał - 126 964,00 zł).

**Wszystkie cele projektu są nadal aktualne i możliwe do osiągnięcia. W chwili obecnej nie ma żadnych obaw, że cele projektu nie zostaną osiągnięte w przewidzianym czasie.**



## "LIFE Pieniny PL"



Projekt LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000034 pt: „Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze „Pieniny”

---

### **Zadania planowane do realizacji w III kwartale 2014 roku.**

1. Wyłonienie wykonawców zabiegów ochronny czynnej na łąkach wykupionych w ramach projektu do końca I kwartału 2014.
2. Wyłonienie wykonawcy zabezpieczania przed osypywaniem się fragmentów murów zewnętrznych zamku Czorsztyn.
3. Rozpoczęcie konkretnych działań ochronnych przewidzianych w projekcie zgodnie z harmonogramem ich wprowadzania (zabezpieczanie murów zamku, zbiór nasion pszonaka pienińskiego, odkrzaczanie łąk oraz koszenie i usuwanie nagromadzonej roślinności na wykupionych łąkach, remont wybranych odcinków szlaków).
4. W ramach współpracy i wymiany doświadczeń z innymi projektami, w drugiej połowie września planowany jest 4-dniowy wyjazd dla 12 osób do Wigierskiego Parku Narodowego prowadzącego projekt Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE 11 NAT/PL/431
5. Planowana jest kontynuacja zadania *B.1 (Zakup gruntów)* w miarę zainteresowania sprzedażą przez potencjalnych zbywców działek.
